


附图(5) 地表水系图



附图(6) 监测点位图

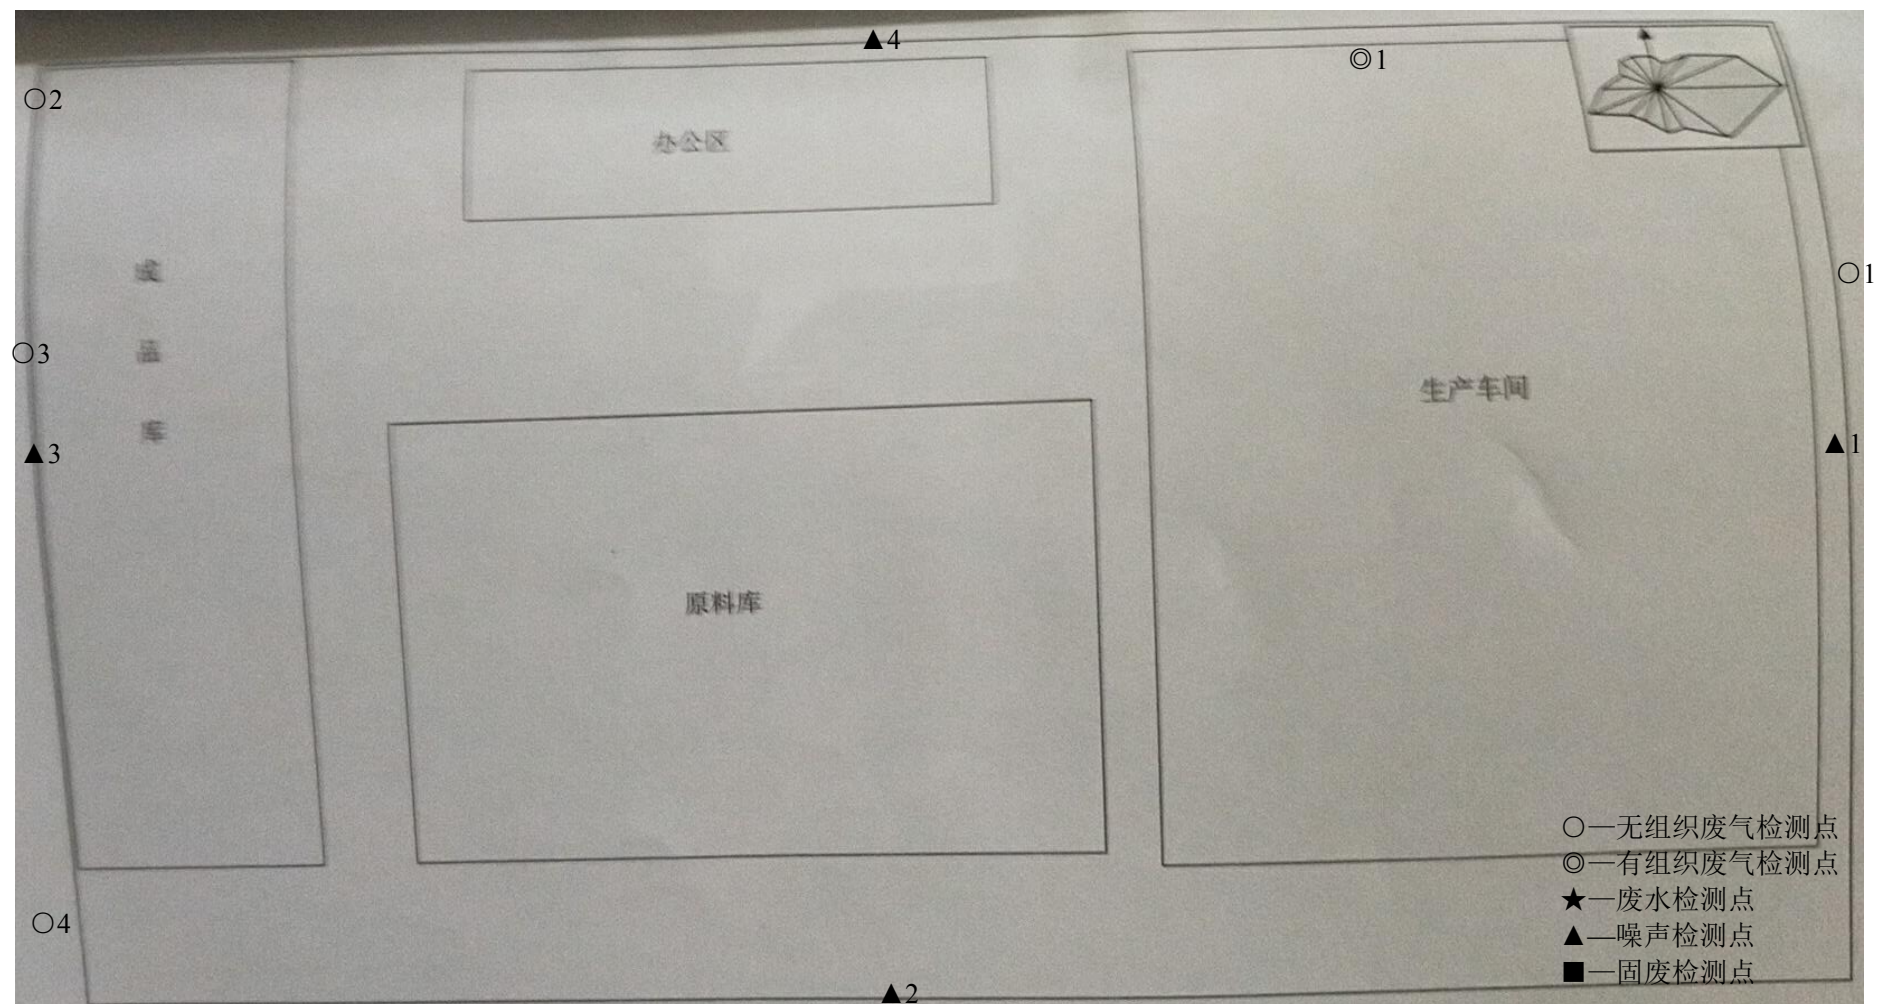

附图(7) 照片



废气治理及排放



废水治理及排放



固废治理及贮存

徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁项目 (废气、废水、噪声部分) 竣工环境保护验收意见

2019年3月8日,徐州市宇田塑料制品厂在本公司组织召开了徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁项目竣工环境保护验收会。参加会议的有徐州市宇田塑料制品厂(建设单位)、江苏京诚检测技术有限公司(验收监测单位)等单位人员及3名专家,共6人(名单附后)。

与会人员现场核查了项目建设运营期环保工作落实情况,查阅建设项目环境影响报告书、竣工环境保护验收检测报告、项目验收环保工作总结及相关材料,根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》和《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》等文件的要求,经认真讨论形成本项目(废水、废气、噪声部分)竣工环境保护验收意见如下:

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

徐州市宇田塑料制品厂投资1500万,在江苏徐州工业园区韩场社区内,建设长寿命功能性农地膜生产搬迁项目。项目产品为地膜,年产量为200吨,占地面积5333 m²;职工人数20人,三班工作制,8h/班,生产天数240d/a,生产时数5760h/a。

2、建设过程及环保审批情况

徐州市宇田塑料制品厂于2018年4月取得徐州市工业园区管理委员会《关于徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁备案通知书》

(徐园经发备〔2018〕19号)。徐州市宇田塑料制品厂委托江苏方正环保设计研究有限公司进行环境影响评价,2018年5月编制完成了《徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁项目环境影响报告表》,2018年6月徐州市贾汪区环境保护局(贾环项〔2018〕70号)《关于徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁项目环境影响报告表的审批意见》予以批复。

长寿命功能性农地膜生产搬迁项目2018年6月动工,2018年7月竣工,2018年7月试运行。

3、投资情况

总投资为1500万元,环保投资为11万元,占总投资的0.73%;

4、验收范围及监测时间

本次验收范围为徐州市宇田塑料制品厂长寿命功能性农地膜生产搬迁项目(废气、废水、噪声)竣工环境保护验收。徐州市宇田塑料制品厂委托江苏京诚检测技术有限公司于2018年8月22~23日进行了竣工环境保护验收检测。

二、工程变动情况

1、原环评批复要求熔融和吹膜工序会产生废气经集气罩统一收集后经活性炭吸附处理,实际建设情况是熔融和吹膜工序会产生废气经集气罩统一收集后经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理。

2、原环评批复要求生活污水经化粪池预处理,达到徐州市工业园区污水处理厂接管标准后,排入该污水处理厂进一步处理。实际建设情况是生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门定期清掏。

其他建设情况与环评及批复基本一致。

三、污染防治措施落实情况以及验收检测结果

（一）废气

1、环评批复要求

本项目建成后，熔融和吹膜工序会产生非甲烷总烃，废气经集气罩统一收集后经活性炭吸附处理，处理后的废气浓度须满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3要求，通过15米高（1#）排气筒高空排放。

2、现场检查情况

熔融和吹膜产生的非甲烷总烃经光氧催化装置+活性炭处理后，通过15m排气筒高空排放。

验收检测结果表明：熔融和吹膜工序产生的废气经处理后非甲烷总烃排放浓度满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3要求。

（二）废水

1、环评批复要求

本项目建成后，生活污水经化粪池预处理，达到徐州市工业园区污水处理厂接管标准后，排入该污水处理厂进一步处理。

2、现场检查情况

厂区使用旱厕，无职工食堂及浴室。少量的生活废水经化粪池预处理后委托环卫部门定期清掏。

（三）噪声

1、环评批复要求
